

2021

Dirección de Gestión de la Inversión

CUNDINAMARCA
iREGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN

Informe desempeño de proyectos Regalías

Primer cuatrimestre 2021



Tabla de contenido

ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO	3
RESULTADOS ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	5
PROYECTOS EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN 31 DICIEMBRE 2020 CON ÍNDICE MENOR A 60	7
PROYECTOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN	10
PROYECTOS SIN REGISTRO DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DE ORDENACIÓN DEL GASTO - SIN CONTRATAR	11
PROYECTOS EN RIESGO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	13
PROYECTOS CERRADOS 2020 -2021	13
PROYECTOS SIN CERRAR	14
ESTADO DE ALERTAS PLATAFORMA GESPROY	15

ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO

El Índice de Gestión de proyectos es la herramienta mediante la cual el Departamento Nacional de Planeación realiza la medición del desempeño de las entidades ejecutoras de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Además, sirve para incentivar los procesos de mejora continua, resaltar y promover buenas prácticas e impulsar el autocontrol y el fortalecimiento institucional.

1. Generalidades

← Inicio

1 Características

- Diferencia: Capacidades institucionales
- Unidad de medida: Proyecto
- Medición según estado proyecto: Sin contratar, En ejecución y Terminado.
- Fuente: Gesproy SGR
- Medición de la Gestión: Trimestral y no acumulada
- VARIABLES: Cobertura y Eficiencia Alcance, Tiempo y Costo

2 Rangos fijos de Clasificación



3 Clasificación entidades

Tipo Ejecutor	Categorías						Total
	1	2	3	4	5	6	
Municipios	8	178	203	213	216	217	1.035
Departamentos	8	8	6	5	6		33
Otros Ejecutores	101	64	30	21	13	7	236
CAR	3	6	4	3	1		17
Total general	120	256	243	242	236	224	1.321

4 Capacidades de los Municipios

- Medición de desempeño municipal*
- Grupos comparables según medios de gestión y resultados.
- 6 niveles de capacidades.
- Dotaciones iniciales según ingresos, población, % cabecera, densidad, pertenencia sistema ciudades, densidad empresarial, agregación per cápita.

Metodología Dir. de Descentralización y Desarrollo Regional – DNP

5 Capacidades de los Departamentos

- Índice Departamental de Competitividad*
- Grupos comparables por nivel de desarrollo
- Clasificación de acuerdo al PIB per cápita
- Diferencia importancia de factores y pilares

Metodología del Consejo Privado de Competitividad

6 Capacidades de Otros Ejecutores

- Criterio de clasificación asociado a la categoría de la entidad territorial donde se encuentra ubicada

Grupo de entidades	Criterio
Descentralizada Orden departamental	Categoría departamento
Descentralizada Orden municipal	Categoría municipio
Entidades de Orden Nacional	Categoría 1
Universidades (nacionales)	Categoría 1
Universidades (departamental)	Categoría departamento

Una de las características más relevantes en Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 2.0, es que la medición de desempeño de los proyectos se realiza en términos de alcance, tiempo y costo, por ello desde la DGI se pretende incentivar y destacar a las entidades mejores ejecutoras de proyectos de conformidad con su capacidad institucional.

Otra de las novedades que trae esta versión 2 del IGPR es que ahora nos permite realizar la consulta para cada uno de los proyectos a través del siguiente link <https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/%C3%8DndiceGesti%C3%B3ndeProyectosdeRegal%C3%ADas20.aspx>.

2. Eficiencia de proyectos

1 → Eficiencia en la gestión de proyectos

Eficiencia en la Contratación - Proyectos con Estado Sin Contratar

Objetivo: Determinar el tiempo en que el proyecto logra suscribir su primer contrato.

Un proyecto de inversión es **eficiente** en la medida que con los recursos aprobados y el tiempo estimado ejecuta los productos definidos.

El IGPR busca determinar la eficiencia de cada proyecto de acuerdo con el **estado** en el que se encuentre a la fecha de la medición en Gesproy

Sin Contratar corresponde a los proyectos aprobados sin suscripción de contratos.

En Ejecución corresponde a los proyectos contratados que no han alcanzado un avance físico del cien por ciento (100%)

Terminados corresponde a los proyectos con ejecución física del cien por ciento (100%) o terminados autónomamente por la entidad ejecutora; se incluye los proyectos cerrados en el trimestre medido.

Para cada estado se definieron indicadores de eficiencia, en relación con la programación del proyecto, los avances físicos, el costo y registro de cumplimiento de metas.

Tiempo entre la aprobación y la contratación	Calificación según la categoría de la entidad					
	1	2	3	4	5	6
Entre 1 y 5 meses	100	100	100	100	100	100 *
Entre 5 y 6 meses	0	20	40 *	60	80	100
Mas de 6 meses	0 *	0	0	0	0	0

Ejemplos: Calificación de proyectos de acuerdo al tiempo que se demoraron en contratar.

Categoría Entidad	Proyecto	Fecha Aprobación	Fecha Corte	Meses para Contratar	Calificación
6	1	1/06/2020	30/09/2020	4.0	100 *
3	1	23/04/2020	30/09/2020	5.3	40 *
1	1	1/02/2020	30/09/2020	8.1	0 *

Una buena calificación de **Eficiencia en la contratación** se alcanza cuando la entidad ejecutora adelanta las gestiones administrativas necesarias para que la contratación de sus proyectos se realice dentro de los cinco meses siguientes a su aprobación.

1 → Eficiencia en la gestión de proyectos

Eficiencia en ejecución:
 Se determina el cumplimiento del alcance, tiempo y costo de acuerdo con lo programado.

Es importante considerar que en la medida que la programación se encuentre orientada a entregables.



Cumplimiento en la programación
 Corresponde a la relación que existe entre el avance físico del proyecto (valor ganado) y el avance programado (valor planeado).
 El indicador responde a cuanto de lo programado ha ejecutado la entidad en términos del avance físico.

Ejemplo: Se programó que a la fecha de medición estarían construidas 5 alcantarillas, el sistema validará que las 5 alcantarillas estén ejecutadas.

Cumplimiento del costo
 Corresponde a la relación que existe el costo programado de la ejecución física a la fecha (valor ganado) y el costo ejecutado (costo actual). Es decir que tanto respecto a lo programado está costando mi ejecución?

Ejemplo: Cual es la relación entre el costo de las 5 alcantarillas según lo programado, frente a lo que realmente están costando?

Retrasos en la ejecución
 Corresponde a determinar si existe desviación en tiempo respecto a cuando programó el avance físico actual. Y que tanto es esa desviación sobre el plazo transcurrido.

Ejemplo: Se programo hace tres meses terminar las 5 alcantarillas y desde el inicio de la programación han pasado 9 meses, el proyecto presentará un retraso de 3 meses y la relación frente al plazo transcurrido es del 33%.

Gestión Administrativa	FORTALEZAS
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporte de aprueba y envía Gesproy oportunamente ✓ Reporte cuentas oportunamente ✓ Cierre de 3 planes de mejoramiento abiertos ✓ Cierre de 3 procesos administrativos preventivos

Gestión del Desempeño	DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyectos sin contratación oportuna – 6 meses luego de aprobado ✓ Proyectos terminados sin cerrar oportunamente - 6 meses luego de terminado ✓ No cumplimiento de la programación
------------------------------	--


Así mismo la medición del desempeño en el SGR, esta contemplado en su Artículo 169 de la Ley 2056 de 2020 el cual establece...**Las entidades ejecutoras de naturaleza pública o privada que se designen como ejecutoras deben acreditar su adecuado desempeño en la gestión de los recursos del SGR, conforme a la metodología que establezca el DNP...**



RESULTADOS ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Últimas Mediciones

II Trimestre-2020	59,61	Nivel Bajo
III Trimestre-2020	62,98	Nivel Medio
IV Trimestre-2020	61,20	Nivel Medio

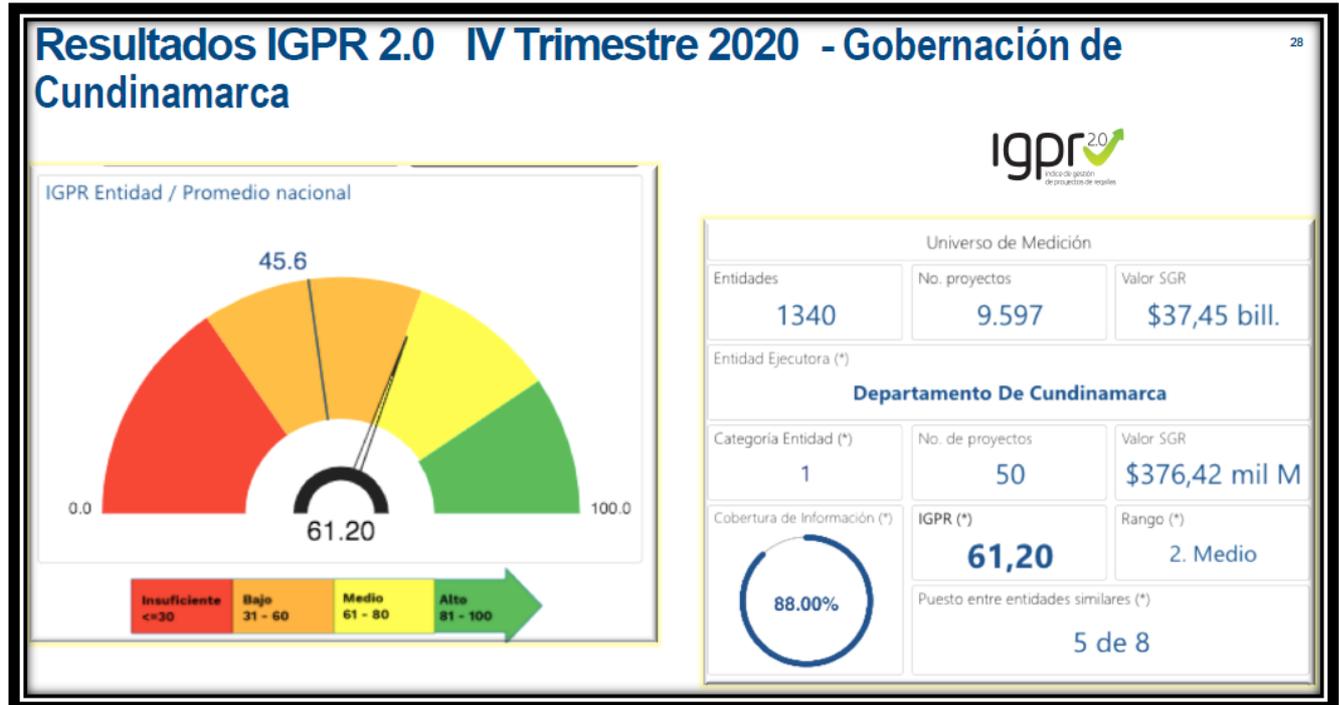

Existe el riesgo para el departamento de no mejorar el índice de gestión de proyectos quedando en un nivel bajo, lo que probablemente conllevaría a la no aprobación directa de recursos y a no ser ejecutores de los proyectos, lo que ocasionaría no cumplimiento de varias metas del plan de desarrollo "Cundinamarca Región que Progresa" la cuales se proyectaron financiar con recursos del Sistema General de Regalías.


De conformidad con la última medición del IGPR, el nivel central del departamento de Cundinamarca se encuentra en un **61.20% nivel medio**. Es por ello que en cabeza del señor Gobernador Nicolás García y a través de la secretaría de planeación, desarrollará las siguientes **10** actividades con el propósito de finalizar el año 2021 con un índice de calificación en nivel alto, lo que conlleva a realizar las acciones en cada entidad ejecutora que den paso a las mejoras en la ejecución de sus proyectos.

1. Acompañamiento permanente por parte de la Dirección de Gestión de la Inversión en subsanación de alertas.
2. Envío de informe mensual del balance de las alertas por entidad ejecutora.
3. Elaboración y presentación ante el Gobernador de Informe cuatrimestral del desempeño de proyectos financiados con recursos del SGR por entidades.

4. Acompañamiento por parte de la Dirección de Gestión de la Inversión en el cierre de Planes de Mejoramiento y demás medidas preventivas.
5. Articulación con la Oficina de Control Interno en el seguimiento de proyectos con las entidades.
6. Visitas de campo a proyectos en ejecución, que generen un informe ejecutivo del balance del proyecto. **Control Social**
7. Capacitación a los responsables de ejecución de proyectos en los siguientes temas: Plataforma Gesproy, Técnica de valor ganado, Índice de Gestión de Proyectos.
8. Elaboración de procedimientos y TIPS a través de videos interactivos en (Ajustes- subsanación de alertas- presupuesto etc.)
9. Creación del Índice de gestión de proyectos de Cundinamarca, (IGPRC) por entidades que permita promover buenas prácticas e impulsar el autocontrol y el fortalecimiento institucional.
10. Reconocimiento anual (Premiación) a la entidad que demuestre ser el mejor en el (IGPRC)

PROYECTOS EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN 31 DICIEMBRE 2020 CON ÍNDICE MENOR A 60

Se identificaron los **20** proyectos que estuvieron con una calificación por debajo de 60 puntos en la calificación individual del IGPR.

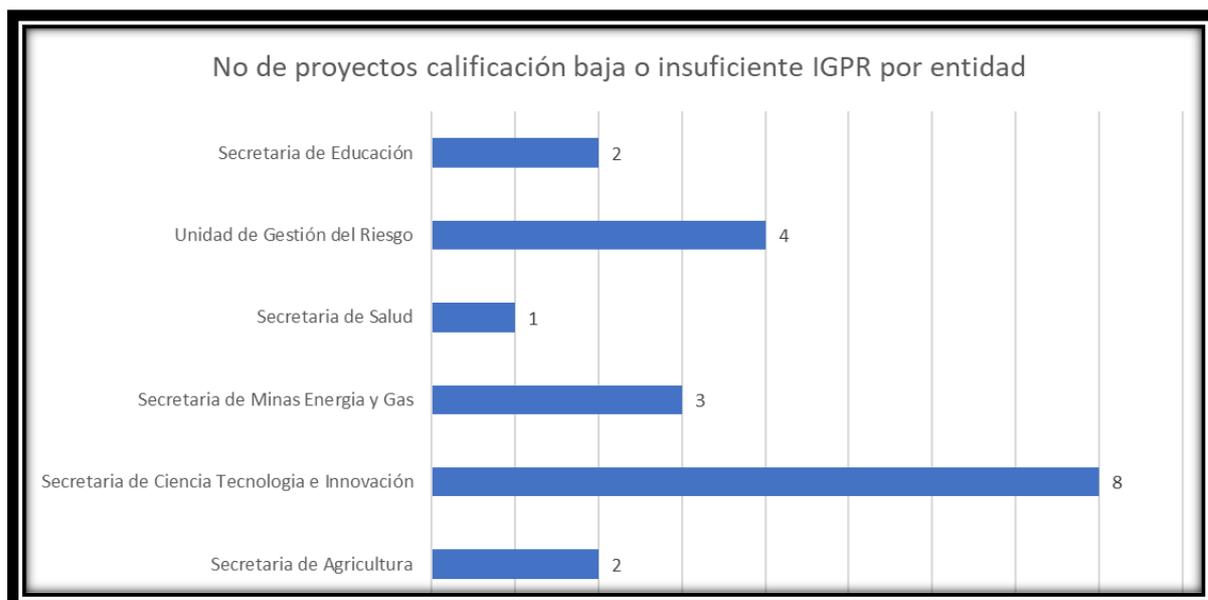

BPIN	Nombre proyecto	Estado	IGPR Proyecto	Rango	Entidad
20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte	1. Sin contratar	0.00	4. Insuficiente	Unidad de Gestión del Riesgo
2018000050036	construcción de obras para la mitigación del riesgo en el municipio de san bernardo, beneficiando a comunidades de los municipios de Arbeláez, Pandi y Venecia cundinamarca	1. Sin contratar	0.00	4. Insuficiente	Unidad de Gestión del Riesgo
2018000100160	Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías de investigación para docentes	1. Sin contratar	0.00	4. Insuficiente	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
2019000050037	Fortalecimiento del sistema departamental para la gestión del riesgo de desastres	1. Sin contratar	0.00	4. Insuficiente	Unidad de Gestión del Riesgo
2019000050039	Estudio y diseño para la construcción de redes eléctricas aéreas en zonas rurales	1. Sin contratar	0.00	4. Insuficiente	Secretaría de Minas Energía y Gas
2013000100248	Innovación, ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de ubate, cundinamarca.	2. En ejecución	56.67	3. Bajo	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
2016000100027	Análisis de factores genéticos, sanitarios y medioambientales que afectan las tasas de preñez a partir de embriones in vitro en el departamento de cundinamarca	2. En ejecución	50.00	3. Bajo	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación

BPIN	Nombre proyecto	Estado	IGPR Proyecto	Rango	Entidad
2017000050064	Construcción de redes eléctricas en zona rural de 13 municipios, en el marco del proyecto iluminando vidas	2. En ejecución	33.33	3. Bajo	Secretaria de Minas Energía y Gas
2017000050065	Mejoramiento de la productividad y rentabilidad de los caficultores	2. En ejecución	36.67	3. Bajo	Secretaria de Agricultura
2017000100016	Implementación programa de innovación para la validación y generación de productos derivados de la biodiversidad	2. En ejecución	46.67	3. Bajo	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
2017000100076	fortalecimiento de capacidades de gestión del riesgo a través de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el departamento de cundinamarca	2. En ejecución	33.33	3. Bajo	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
2017000100087	Formación de talento humano de alto nivel en maestrías	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
2017000100104	Fortalecimiento de la cultura de la gestión y utilización del conocimiento en ctei en niños, jóvenes y comunidades	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
2019000050027	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de cacao en el departamento de cundinamarca	2. En ejecución	33.33	3. Bajo	Secretaria de Agricultura
2019000050073	Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible domiciliario a través de la financiación de la conexión y la red interna para usuarios de barrios periféricos, veredas y centros poblados del departamento de cundinamarca	2. En ejecución	33.33	3. Bajo	Secretaria de Minas Energía y Gas
2020000050012	Adquisición de elementos de protección de contagio del virus covid-19 para los cuerpos operativos de emergencia, en atención de la calamidad sanitaria en el departamento de cundinamarca	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Unidad de Gestión del Riesgo
2020000050019	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2020, en los municipios del departamento de cundinamarca	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Secretaria de Educación
2020000100137	Fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos para la salud pública, a través del mejoramiento del laboratorio de salud pública de cundinamarca	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación

BPIN	Nombre proyecto	Estado	IGPR Proyecto	Rango	Entidad
2019000050036	Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento de la red hospitalaria del departamento cundinamarca	3. Terminado	33.33	3. Bajo	Secretaria de Salud
2019000050044	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para municipios no certificados, vigencia 2019 del departamento de cundinamarca	3. Terminado	23.33	4. Insuficiente	Secretaria de Educación

PROYECTOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Para iniciar la ejecución de proyectos de inversión se debe contar con la certificación de cumplimiento de requisitos de ejecución, la cual se tramitará a través de la secretaria de planeación del departamento, excepto los proyectos financiados por el fondo de Ciencia Tecnología e Innovación esta se tramitarán con la Secretaria Técnica del OCAD. Los siguientes son los requisitos para cumplimiento de requisitos.

- ❏ Copia del acto administrativo de incorporación de los recursos en un capítulo independiente del presupuesto que debe adelantarse una vez se haya aceptado la designación como ejecutor.
- ❏ Programación mensual del giro de los recursos del SGR por tipo de fuente de recursos, que se requerirá durante el tiempo de ejecución del proyecto y por el monto total de los recursos del SGR aprobados, según los lineamientos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- ❏ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para fuentes distintas al SGR, el (los) acuerdo (s) de aprobación del (los) OCAD, o documento que haga sus veces, que soporte las fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de inversión.
- ❏ Para proyectos de inversión que no contemplen como uno de sus componentes el pago de licencias y permisos, se deben presentar las licencias definitivas y permisos previstos en la normativa vigente y aplicable, si a ellas hubiere lugar.

TIPOENTIDAD	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD	Proyectos con (4.52) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2019000050026	Desarrollo de un programa productivo amigable con el medio ambiente del sector ganadero
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100696	Fortalecimiento de capacidades de CTEI para la reactivación económica y la transformación productiva

SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Proyectos con (7) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la Ciencia y la tecnología - Un viaje con la ciencia
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100695	Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades comunitarias en la comprensión y mitigación de los problemas de violencias basadas en género derivadas de la emergencia por Covid 19
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Proyectos con (7) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor agregado
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Proyectos con (4.26) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000050037	Dotación del mobiliario escolar para las instituciones educativas de los municipios no certificados
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100650	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la innovación educativa en los niveles de básica y media mediante uso de las tics en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100649	Fortalecimiento de capacidades de CTel para el relacionamiento escuela - contexto rural mediante la apropiación y uso de las TICs en el municipio de Sibaté

PROYECTOS SIN REGISTRO DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DE ORDENACIÓN DEL GASTO - SIN CONTRATAR

El artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020 establece que... La ejecución de los proyectos de inversión se adelantará por la entidad designada para tal fin por la instancia competente, según corresponda. La entidad designada como ejecutora deberá cumplir con los requisitos legales para la ejecución de los proyectos de inversión establecidos por la normativa vigente. **Si a los seis (6) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación, el ejecutor no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 o el que lo modifique, adicione o sustituya, o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, se liberarán automáticamente los recursos para la aprobación de nuevos proyectos.** Así las cosas a continuación se presentan los proyectos por entidad que a la fecha no han iniciado su proceso precontractual.

TIPO ENTIDAD	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100695	Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades comunitarias en la comprensión y mitigación de los problemas de violencias basadas en género derivadas de la emergencia por Covid
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100696	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la reactivación económica y la transformación productiva
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	Han transcurrido 521 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 04/06/2020	20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Han transcurrido 128 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 30/06/2021	2020000050037	Dotación del mobiliario escolar para las instituciones educativas de los municipios no certificados
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 212 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 08/04/2021	2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor agregado
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 212 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 08/04/2021	2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la Ciencia y la tecnología - Un viaje con la ciencia
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD	Han transcurrido 136 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 23/06/2021	2019000050026	Desarrollo de un programa productivo amigable con el medio ambiente del sector ganadero
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100649	Fortalecimiento de capacidades de CTel para el relacionamiento escuela - contexto rural mediante la apropiación y uso de las TICs en el municipio de Sibaté
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100650	Fortalecimiento de capacidades de CTel para la innovación educativa en los niveles de básica y media mediante uso de las tics en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados

PROYECTOS EN RIESGO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

TIPO ENTIDAD	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	Han transcurrido 521 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 04/06/2020	20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 212 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 08/04/2021	2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor agregado
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Han transcurrido 212 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 08/04/2021	2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la Ciencia y la tecnología - Un viaje con la ciencia

PROYECTOS CERRADOS 2020 -2021

Los cierres de los proyectos consisten en expedir un acto administrativo firmado por el señor gobernador, en donde se da cuenta del balance financiero, cumplimiento de metas e indicadores y demás aspectos relevantes en la ejecución de los proyectos. Desde el año 2020 se viene desarrollando una estrategia de acompañamiento permanente por parte de la Dirección de Gestión de la Inversión en el cierre de proyectos lo que ha permitido a la fecha cerrar 10 proyectos así:

BPIN	Nombre	Entidad
2013000100217	Fortalecimiento de la competitividad del sector floricultor colombiano mediante el uso de ciencia, tecnología e innovación aplicadas en el departamento de cundinamarca	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
2017000050061	Adquisición ambulancias de transporte asistencial básico (tab) y transporte asistencial medicalizada (tam), para el apoyo del sistema de referencia y contra referencia de la red hospitalaria del departamento de cundinamarca	Secretaria de Salud
2013000050051	Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos, a través de sistemas regionales en las provincias de ubate y rionegro en el departamento de cundinamarca	Secretaria de Ambiente
2017000050062	Fortalecimiento de las cadenas productivas de mango, aguacate y cítricos en el departamento de cundinamarca	Secretaria de Agricultura
2019000050036	Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento de la red hospitalaria del departamento cundinamarca	Secretaria de Salud
2013000100247	Investigación e innovación tecnológica y apropiación social de conocimiento científico de orquídeas nativas de cundinamarca	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación

BPIN	Nombre	Entidad
2012000050029	implementación y masificación del servicio de gas combustible por redes para municipios de Anolaima, Cachipay, Choachi, Fomeque, Ubaque y Viota cundinamarca	Secretaria de Minas y Energía y gas
2016000050005	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente - 2016	Secretaria de Educación
2017000050033	fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para municipios no certificados del departamento de cundinamarca	Secretaria de Educación
2019000050044	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación Escolar para Municipios no certificados, Vigencia 2019 del Departamento de Cundinamarca	Secretaria de Educación

PROYECTOS SIN CERRAR

De conformidad con el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.4.2.6.1 el cual establece que corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con **recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes** a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente.


A la fecha se encuentran **12** proyectos sin cerrar, lo que está ocasionando alertas en la plataforma Gesproy y por ende una mala calificación en el Índice de Gestión de Proyectos.

BPIN	Nombre	Observación	Entidad
2014000050010	Construcción de un centro de atención especializada al servicio de adolescentes infractores de la ley penal	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 1134 - 34 meses	Secretaria de Gobierno
2013000050028	Fortalecimiento del subsector panelero en el departamento de cundinamarca	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 1620 - 48 meses	Secretaria de Agricultura
2013000050027	Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la productividad y la competitividad en el departamento de cundinamarca, centro oriente	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 1316 - 43,8 meses	Secretaria de Agricultura
2012000050030	Desarrollo creación y fortalecimiento de nueve (9) centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 1720 - 57 meses	Secretaria de Competitividad
2012000100056	Investigación estrategias de valoración y apropiación de los recursos naturales mecanismos de adaptación a cambio climático región del bajo magdalena	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 1620 - 48 meses	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
2018000050019	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente 2018 cundinamarca	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 494 - 16 meses	Secretaria de Educación

BPIN	Nombre	Observación	Entidad
2012000050010	Estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural palacio de san francisco en Bogotá D.C.	Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 859 - 28,6 meses	Secretaria General
2013000050026	Construcción redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebuena y Gutiérrez	Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 1955 - 65 meses	Secretaria de Minas y Energía
2012000050023	Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo regional	Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 159 - 5,3 meses	Secretaria de Agricultura
2017000050027	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente 2017	Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 1224 - 40,8 meses	Secretaria de Educación
2019000050020	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes para el año 2019 en los municipios del departamento de cundinamarca	Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 555 - 18,5 meses	Secretaria de Educación
2020000050012	Adquisición de elementos de protección de contagio del virus covid-19 para los cuerpos operativos de emergencia, en atención de la calamidad sanitaria en el departamento de cundinamarca	Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 189 - 6,3 meses	Unidad de Gestión del Riesgo

ESTADO DE ALERTAS PLATAFORMA GESPROY

A continuación, se presentan las alertas identificadas en la plataforma Gesproy, con corte 30 de abril 2021 en donde se relaciona por cada secretaria a fin de que se tomen las acciones pertinentes y lograr la subsanación de estas. **Cabe indicar que para los proyectos con BPIN 2019000050073 y 2020000050003, se identificaron errores de plataforma, en donde se informo al DNP para que realicen los trámites con mesa de ayuda y eliminar dichas alertas.**

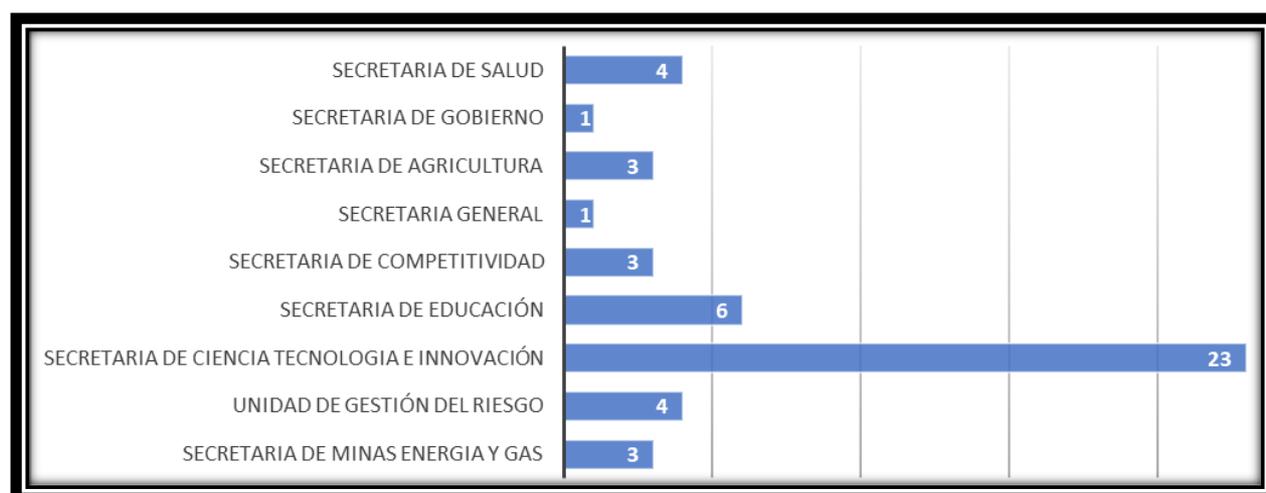

SECRETARIA DE SALUD

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Contrato(s) sin rp : 1000;598;601;721;751;755;836;845;846;865	2020000050003
Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 23599968 Valor contrato fuentes 0 Diferencia	2020000050003
Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 19554259 Valor contrato fuentes 0 Diferencia	2020000050003
Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 23599968 Valor contrato fuentes 0 Diferencia	2020000050003

SECRETARIA DE GOBIERNO

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyecto terminado sin cerrar Nro. días: 1134	2014000050010

SECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyecto terminado sin cerrar Nro. días: 159	2012000050023
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyecto terminado sin cerrar Nro. días: 1620	2013000050028
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyecto terminado sin cerrar Nro. días: 1316	2013000050027

SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 859	2012000050010

SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyectos con (4.52) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2019000050026
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro. días:	2019000050026
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 136 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 23/06/2021	2019000050026

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyecto con (4.26) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000050037
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyecto terminado sin cerrar Nro. días: 494	2018000050019
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyecto terminado sin cerrar Nro. días: 1224	2017000050027
Proyecto terminado sin cerrar.	Proyecto terminado sin cerrar Nro. días: 555	2019000050020
Proyectos sin programación registrada	Proyecto sin programación registrada Nro días:	2020000050037
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 128 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 30/06/2021	2020000050037

SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : S/N	2018000100160
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100696
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyectos con (7) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100266
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100695
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyectos con (7) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100246
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100650
Proyectos sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución.	Proyectos con (4.65) meses desde la aprobación, sin certificación del cumplimiento de requisitos de ejecución en Gesproy-SGR	2020000100649
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada	2020000100246
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada:	2020000100695
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada	2018000100160
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada	2020000100650

DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada	2020000100266
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada	2020000100649
Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada	2020000100696
Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro. Días:	2013000100129
Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 4756402724 Valor contrato fuentes 3693673299 Diferencia	2013000100129
Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 403410000 Valor contrato fuentes 105655000 Diferencia	2013000100129
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100695
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100696
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 212 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 08/04/2021	2020000100246
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 212 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 08/04/2021	2020000100266
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100649
Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 140 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100650
