

2021

Dirección de Gestión de la Inversión

CUNDINAMARCA
iREGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN

Informe desempeño de proyectos Regalías

Segundo cuatrimestre 2021



Elaboró: Dayana Fernández
Revisó: Rusvel Nieto Molina

Tabla de contenido

ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO	3
RESULTADOS ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	5
PROYECTOS EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN 31 DICIEMBRE 2020 CON ÍNDICE MENOR A 60	6
PROYECTOS SIN REGISTRO DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DE ORDENACIÓN DEL GASTO - SIN CONTRATAR	10
PROYECTOS CON ACTO DE APERTURA DEL PROCESO CONTRACTUAL - SIN INICIO DE CONTRATACIÓN	11
PROYECTOS EN RIESGO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	12
PROYECTOS CERRADOS 2020 -2021	12
PROYECTOS SIN CERRAR	13
ESTADO DE ALERTAS PLATAFORMA GESPROY	14

ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO

El Índice de Gestión de proyectos es la herramienta mediante la cual el Departamento Nacional de Planeación realiza la medición del desempeño de las entidades ejecutoras de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Además, sirve para incentivar los procesos de mejora continua, resaltar y promover buenas prácticas e impulsar el autocontrol y el fortalecimiento institucional.

1. Generalidades

← Inicio

1 Características

- Diferencia: Capacidades institucionales
- Unidad de medida: Proyecto
- Medición segun estado proyecto: Sin contratar, En ejecución y Terminado.
- Fuente: Gesproy SGR
- Medición de la Gestión: Trimestral y no acumulada
- Variables: Cobertura y Eficiencia Alcance, Tiempo y Costo

2 Rangos fijos de Clasificación



3 Clasificación entidades

Tipo Ejecutor	Categorías						Total
	1	2	3	4	5	6	
Municipios	8	178	203	213	216	217	1.035
Departamentos	8	8	6	5	6		33
Otros Ejecutores	101	64	30	21	13	7	236
CAR	3	6	4	3	1		17
Total general	120	256	243	242	236	224	1.321

4 Capacidades de los Municipios

- Medición de desempeño municipal*
- Grupos comparables segun medios de gestión y resultados.
- 6 niveles de capacidades.
- Dotaciones iniciales segun ingresos, población, % cabecera, densidad, pertenencia sistema ciudades, densidad empresarial, agregación per cápita.

Metodología Dir. de Descentralización y Desarrollo Regional – DNP

5 Capacidades de los Departamentos

- Índice Departamental de Competitividad*
- Grupos comparables por nivel de desarrollo
- Clasificación de acuerdo al PIB per cápita
- Diferencia importancia de factores y pilares

Metodología del Consejo Privado de Competitividad

6 Capacidades de Otros Ejecutores

- Criterio de clasificación asociado a la categoría de la entidad territorial donde se encuentra ubicada

Grupo de entidades	Criterio
Descentralizada Orden departamental	Categoría departamento
Descentralizada Orden municipal	Categoría municipio
Entidades de Orden Nacional	Categoría 1
Universidades (nacionales)	Categoría 1
Universidades (departamental)	Categoría departamento

Una de las características más relevantes en Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 2.0, es que la medición de desempeño de los proyectos se realiza en términos de alcance, tiempo y costo, por ello desde la DGI se pretende incentivar y destacar a las entidades mejores ejecutoras de proyectos de conformidad con su capacidad institucional.

Otra de las novedades que trae esta versión 2 del IGPR es que ahora nos permite realizar la consulta para cada uno de los proyectos a través del siguiente link <https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/%C3%8DndiceGesti%C3%B3ndeProyectosdeRegal%C3%ADas20.aspx>.

2. Eficiencia de proyectos

1 → Eficiencia en la gestión de proyectos

- Un proyecto de inversión es **eficiente** en la medida que con los recursos aprobados y el tiempo estimado ejecuta los productos definidos.
- El IGPR busca determinar la eficiencia de cada proyecto de acuerdo con el **estado** en el que se encuentre a la fecha de la medición en Gesproy

Sin Contratar corresponde a los proyectos aprobados sin suscripción de contratos.

En Ejecución corresponde a los proyectos contratados que no han alcanzado un avance físico del cien por ciento (100%)

Terminados corresponde a los proyectos con ejecución física del cien por ciento (100%) o terminados autónomamente por la entidad ejecutora; se incluye los proyectos cerrados en el trimestre medido.

Para cada estado se definieron indicadores de eficiencia, en relación con la programación del proyecto, los avances físicos, el costo y registro de cumplimiento de metas.

Eficiencia en la Contratación - Proyectos con Estado Sin Contratar

Objetivo: Determinar el tiempo en que el proyecto logra suscribir su primer contrato.

Tiempo entre la aprobación y la contratación	Calificación según la categoría de la entidad					
	1	2	3	4	5	6
Entre 1 y 5 meses	100	100	100	100	100	100 *
Entre 5 y 6 meses	0	20	40 *	60	80	100
Mas de 6 meses	0 *	0	0	0	0	0

Ejemplos: Calificación de proyectos de acuerdo al tiempo que se demoraron en contratar.

Categoría Entidad	Proyecto	Fecha Aprobación	Fecha Corte	Meses para Contratar	Calificación
6	1	1/06/2020	30/09/2020	4.0	100 *
3	1	23/04/2020	30/09/2020	5.3	40 *
1	1	1/02/2020	30/09/2020	8.1	0 *

Una buena calificación de **Eficiencia en la contratación** se alcanza cuando la entidad ejecutora adelanta las gestiones administrativas necesarias para que la contratación de sus proyectos se realice dentro de los cinco meses siguientes a su aprobación.

1 → Eficiencia en la gestión de proyectos

- Eficiencia en ejecución:** Se determina el cumplimiento del alcance, tiempo y costo de acuerdo con lo programado.

Es importante considerar que en la medida que la programación se encuentre orientada a entregables.



- Cumplimiento en la programación**

Corresponde a la relación que existe entre el avance físico del proyecto (valor ganado) y el avance programado (valor planeado).

El indicador responde a cuanto de lo programado ha ejecutado la entidad en términos del avance físico.

Ejemplo: Se programó que a la fecha de medición estarían construidas 5 alcantarillas, el sistema validará que las 5 alcantarillas estén ejecutadas.
- Cumplimiento del costo**

Corresponde a la relación que existe el costo programado de la ejecución física a la fecha (valor ganado) y el costo ejecutado (costo actual). Es decir que tanto respecto a lo programado está costando mi ejecución?

Ejemplo: Cual es la relación entre el costo de las 5 alcantarillas según lo programado, frente a lo que realmente están costando?
- Retrasos en la ejecución**

Corresponde a determinar si existe desviación en tiempo respecto a cuando programó el avance físico actual. Y que tanto es esa desviación sobre el plazo trascurrido.

Ejemplo: Se programo hace tres meses terminar las 5 alcantarillas y desde el inicio de la programación han pasado 9 meses, el proyecto presentará un retraso de 3 meses y la relación frente al plazo transcurrido es del 33%.

Gestión Administrativa	FORTALEZAS <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reporte de aprueba y envía Gesproy oportunamente ✓ Reporte cuentas oportunamente ✓ Cierre de 3 planes de mejoramiento abiertos ✓ Cierre de 3 procesos administrativos preventivos
Gestión del Desempeño	DEBILIDADES <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyectos sin contratación oportuna – 6 meses luego de aprobado ✓ Proyectos terminados sin cerrar oportunamente - 6 meses luego de terminado ✓ No cumplimiento de la programación ✓ Inconsistencias en el reporte de información en la plataforma SPGR

Así mismo la medición del desempeño en el SGR, está contemplado en su Artículo 169 de la Ley 2056 de 2020 el cual establece...**Las entidades ejecutoras de naturaleza pública o privada que se designen como ejecutoras deben acreditar su adecuado desempeño en la gestión de los recursos del SGR, conforme a la metodología que establezca el DNP...**



RESULTADOS ÍNDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Últimas Mediciones

II Trimestre-2020	59,61	Nivel Bajo
III Trimestre-2020	62,98	Nivel Medio
IV Trimestre-2020	61,20	Nivel Medio
I Trimestre-2021	64,27	Nivel Medio




Existe el riesgo para el departamento de no mejorar el índice de gestión de proyectos quedando en un nivel bajo, lo que probablemente conllevaría a la no aprobación directa de recursos y a no ser ejecutores de los proyectos, lo que ocasionaría no cumplimiento de varias metas del plan de desarrollo “Cundinamarca Región que Progresa” la cuales se proyectaron financiar con recursos del Sistema General de Regalías.

De conformidad con la última medición del IGPR, el nivel central del departamento de Cundinamarca se encuentra en un **64.27% nivel medio**.

Aunque existe un incremento del **3.07%** entre el último trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, es necesario continuar generando acciones que conlleven a aumentar el mismo.

PROYECTOS EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN 31 DICIEMBRE 2020 CON ÍNDICE MENOR A 60

Se identificaron los **11** proyectos que estuvieron con una calificación por debajo de 60 puntos en la calificación individual del IGPR. Lo que ocasionó un índice institucional en nivel medio, razón por la cual se espera que las entidades tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para aumentar en índice en estos proyectos en la siguiente medición del IGPR.

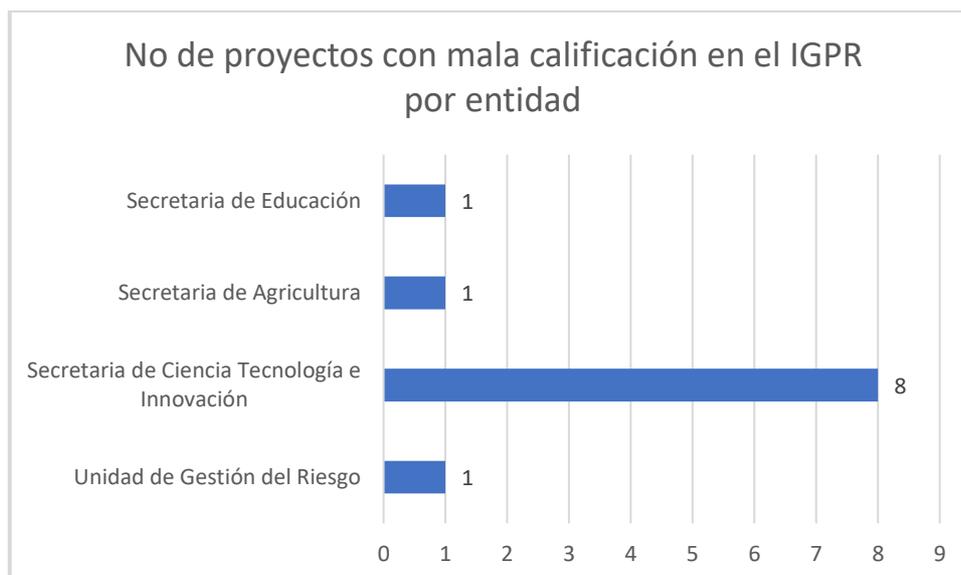

BPIN	Nombre proyecto	Estado	IGPR Proyecto	Rango	Entidad
20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte	1. Sin contratar	0.00	4. Insuficiente	Unidad de Gestión del Riesgo
Recomendación: Con base en la normatividad vigente, realice las gestiones que correspondan para la suscripción de los contratos del proyecto en el menor tiempo posible, han pasado más de 19 meses desde su aprobación. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar contratación del proyecto)					
2018000100160	Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías de investigación para docentes	1. Sin contratar	0.00	4. Insuficiente	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Recomendación: Con base en la normatividad vigente, realice las gestiones que correspondan para la suscripción de los contratos del proyecto en el menor tiempo posible, han pasado más de 18 meses desde su aprobación. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar contratación del proyecto)					
2013000100176	Innovación sistema de producción de frutas/hortalizas frescas/procesadas tipo exportación con tecnología biológica /integral inocua Subachoque, cundinamarca, centro oriente	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Recomendación: 1. El proyecto presentan desviaciones mayores al 60% respecto al avance físico programado. Gestione con los contratistas o encargados de la ejecución las acciones para aumentar el rendimiento y lograr el cumplimiento del avance físico respecto al programado antes de la fecha final programada o verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Según la información reportada, la ejecución del 100% de las actividades del proyecto está en riesgo, actualmente el costo de las actividades ejecutadas tienen una desviación del 60% del valor planeado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 3. Realice una revisión del desempeño en la ejecución de las actividades, la ejecución de actividades reportadas tiene un retraso de más del 50% del plazo transcurrido					

BPIN	Nombre proyecto	Estado	IGPR Proyecto	Rango	Entidad
del proyecto. Si continúa con este rendimiento tiene una alta probabilidad que no termine las ejecución de las actividades y la entrega de los productos esperados en el tiempo programado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar contratación del proyecto)					
2013000100248	Innovación, ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de ubate, cundinamarca.	2. En ejecución	56.67	3. Bajo	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Recomendación: 1. Realice las gestiones que correspondan con sus contratistas o encargados de la ejecución física del proyecto, para aumentar el rendimiento, actualmente presenta desviaciones entre el 15% y 30% respecto al avance físico programado o verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Continúe con este rendimiento que garantiza el cumplimiento del costo, sus actividades se ejecutan conforme al costo planeado.; 3. Realice una revisión del desempeño en la ejecución de las actividades, la ejecución de actividades reportadas tienen un retraso de más del 50% del plazo transcurrido del proyecto. Si continúa con este rendimiento tiene una alta probabilidad que no termine las ejecución de las actividades y la entrega de los productos esperados en el tiempo programado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)					
2016000100027	Análisis de factores genéticos, sanitarios y medioambientales que afectan las tasas de preñez a partir de embriones in vitro en el departamento de cundinamarca	2. En ejecución	60.00	3. Bajo	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Recomendación: 1. Realice las gestiones que correspondan con sus contratistas o encargados de la ejecución física del proyecto, para aumentar el rendimiento, actualmente presenta desviaciones entre el 15% y 30% respecto al avance físico programado o verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Realice las gestiones que correspondan para mejorar el rendimiento del costo de las actividades ejecutadas. Actualmente tienen un costo entre el 15% y 30% mayor al programado, Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 3. Su proyecto presenta un retraso en la ejecución del 50% frente al plazo transcurrido. Gestione con contratistas o encargados de la ejecución del proyecto la mejora en el rendimiento frente a la ejecución de las actividades. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)					
2017000100076	Fortalecimiento de capacidades de gestión del riesgo a través de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en el departamento de cundinamarca	2. En ejecución	33.33	3. Bajo	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Recomendación: 1. Las actividades ejecutadas superan en más del 10% la programación; verifique el rendimiento de sus contratos, frente al rendimiento esperado en el proyecto. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Realice una revisión exhaustiva de los recursos aprobados para proyecto frente al costo de las actividades planeadas y productos esperados. Verifique si procede una liberación de recursos para que estos sean usados en otras inversiones. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 3. Continúe con el rendimiento que reporta, el proyecto se encuentra ejecutado en los plazos programados. (Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)					
2017000100087	Formación de talento humano de alto nivel en maestrías	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación

BPIN	Nombre proyecto	Estado	IGPR Proyecto	Rango	Entidad
<p>Recomendación: 1. El proyecto presentan desviaciones mayores al 60% respecto al avance físico programado. Gestione con los contratistas o encargados de la ejecución las acciones para aumentar el rendimiento y lograr el cumplimiento del avance físico respecto al programado antes de la fecha final programada o verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Según la información reportada, la ejecución del 100% de las actividades del proyecto está en riesgo, actualmente el costo de las actividades ejecutadas tienen una desviación del 60% del valor planeado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 3. Realice una revisión del desempeño en la ejecución de las actividades, la ejecución de actividades reportadas tiene un retraso de más del 50% del plazo transcurrido del proyecto. Si continúa con este rendimiento tiene una alta probabilidad que no termine la ejecución de las actividades y la entrega de los productos esperados en el tiempo programado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.</p> <p>(Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)</p>					
2017000100104	Fortalecimiento de la cultura de la gestión y utilización del conocimiento en CTEI en niños, jóvenes y comunidades	2. En ejecución	60.00	3. Bajo	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
<p>Recomendación: 1. Realice las gestiones que correspondan con sus contratistas o encargados de la ejecución física del proyecto, para aumentar el rendimiento, actualmente presenta desviaciones entre el 30% y 60% respecto al avance físico programado o Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Continúe con este rendimiento que garantiza el cumplimiento del costo, sus actividades se ejecutan conforme al costo planeado.; 3. Su proyecto presenta un retraso en la ejecución del 50% frente al plazo transcurrido. Gestione con contratistas o encargados de la ejecución del proyecto la mejora en el rendimiento frente a la ejecución de las actividades. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)</p>					
2019000050027	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de cacao en el departamento de cundinamarca	2. En ejecución	46.67	3. Bajo	Secretaría de Agricultura
<p>Recomendación: 1. Realice las gestiones que correspondan con sus contratistas o encargados de la ejecución física del proyecto, para aumentar el rendimiento, actualmente presenta desviaciones entre el 15% y 30% respecto al avance físico programado o verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Realice una revisión exhaustiva de los recursos aprobados para proyecto frente al costo de las actividades planeadas y productos esperados. Verifique si procede una liberación de recursos para que estos sean usados en otras inversiones. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 3. Su proyecto presenta un retraso en la ejecución del 30% frente al plazo transcurrido. Gestione con contratistas o encargados de la ejecución del proyecto la mejora en el rendimiento frente a la ejecución de las actividades. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)</p>					
2020000050019	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para el año 2020, en los municipios del departamento de cundinamarca	2. En ejecución	0.00	4. Insuficiente	Secretaría de Educación
<p>Recomendación: 1. El proyecto presentan desviaciones mayores al 60% respecto al avance físico programado. Gestione con los contratistas o encargados de la ejecución las acciones para aumentar el rendimiento y lograr el cumplimiento del avance físico respecto al programado antes de la fecha final programada o verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Según la información reportada, la ejecución del 100% de las actividades del proyecto está en riesgo, actualmente el costo de las actividades ejecutadas tienen una desviación del 60% del valor planeado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 3. Realice una revisión del desempeño en la ejecución de las actividades, la ejecución de actividades reportadas tiene un retraso de más del 50% del plazo transcurrido</p>					

BPIN	Nombre proyecto	Estado	IGPR Proyecto	Rango	Entidad
del proyecto. Si continúa con este rendimiento tiene una alta probabilidad que no termine las ejecución de las actividades y la entrega de los productos esperados en el tiempo programado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)					
2020000100137	Fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos para la salud pública, a través del mejoramiento del laboratorio de salud pública de cundinamarca	2. En ejecución	33.33	4. Bajo	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
Recomendación: 1. El proyecto presentan desviaciones mayores al 60% respecto al avance físico programado. Gestione con los contratistas o encargados de la ejecución las acciones para aumentar el rendimiento y lograr el cumplimiento del avance físico respecto al programado antes de la fecha final programada o verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Continúe con este rendimiento que garantiza el cumplimiento del costo, sus actividades se ejecutan conforme al costo planeado.; 3. Realice una revisión del desempeño en la ejecución de las actividades, la ejecución de actividades reportadas tienen un retraso de más del 50% del plazo transcurrido del proyecto. Si continúa con este rendimiento tiene una alta probabilidad que no termine las ejecución de las actividades y la entrega de los productos esperados en el tiempo programado. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados. (Realizar Reprogramación del Proyecto y Cargar ejecuciones)					

PROYECTOS SIN REGISTRO DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DE ORDENACIÓN DEL GASTO - SIN CONTRATAR

El artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020 establece que... La ejecución de los proyectos de inversión se adelantará por la entidad designada para tal fin por la instancia competente, según corresponda. La entidad designada como ejecutora deberá cumplir con los requisitos legales para la ejecución de los proyectos de inversión establecidos por la normativa vigente. **Si a los seis (6) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación, el ejecutor no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 o el que lo modifique, adicione o sustituya, o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, se liberarán automáticamente los recursos para la aprobación de nuevos proyectos.** Así las cosas, a continuación se presentan los proyectos por entidad que a la fecha no han iniciado su proceso precontractual.

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	FECHA DE APROBACIÓN	ENTIDAD EJECUTORA
2020000100650	Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa en los niveles de básica y media mediante uso de las TICs en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados	\$10.804.663.122	18/12/2020	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	FECHA DE APROBACIÓN	ENTIDAD EJECUTORA
	del departamento de Cundinamarca.			
2020000100696	Fortalecimiento de capacidades de CTel para la reactivación económica y la transformación productiva en Cundinamarca.	\$7.370.634.083	8/12/2020	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte.	\$3.084.907.873	03/12/2019	Unidad de Gestión del Riesgo

PROYECTOS CON ACTO DE APERTURA DEL PROCESO CONTRACTUAL - SIN INICIO DE CONTRATACIÓN

El Decreto 804 del 21 de julio de 2021, adicionó al Decreto Reglamentario en el artículo 1.2.10.1.4 – Responsabilidad de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, numeral f: “Expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación del proyecto de inversión que emita la entidad o instancia, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto. Numeral k: “Publicar el proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOPI) o el que haga sus veces, de conformidad con el régimen de contratación aplicable, una vez se realice la apropiación presupuestal en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR)”.

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	FECHA DE APERTURA PROCESO PRECONTRACTUAL	ENTIDAD EJECUTORA
2018000100160	Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías de investigación para docentes del departamento de Cundinamarca.	\$5.217.415.747	13/03/2020	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
2019000050026	Desarrollo de un programa productivo amigable con el medio ambiente del sector ganadero en el Departamento de Cundinamarca.	\$9.757.143.522	18/06/2021	Secretaría de Competitividad
2020000050037	Dotación del mobiliario escolar para las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca.	\$10.093.038.848	28/06/2021	Secretaría de Educación
2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor agregado en el Departamento de Cundinamarca.	\$3.144.525.520	23/06/2021	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la Ciencia y la tecnología - Un viaje con la ciencia en el departamento de Cundinamarca.	\$2.241.429.590	23/06/2021	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación

BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	FECHA DE APERTURA PROCESO PRECONTRACTUAL	ENTIDAD EJECUTORA
2020000100649	Fortalecimiento de capacidades de CTel para el relacionamiento escuela - contexto rural mediante la apropiación y uso de las TICs en el municipio de Sibaté departamento de Cundinamarca.	\$4.292.464.018	22/06/2021	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
2020000100695	Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades comunitarias en la comprensión y mitigación de los problemas de violencias basadas en género derivadas de la emergencia por Covid 19 en Cundinamarca.	\$3.100.000.000	23/06/2021	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación

PROYECTOS EN RIESGO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

TIPOENTIDAD	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO	Han transcurrido 521 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 04/06/2020	20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte

PROYECTOS CERRADOS 2020 -2021

Los cierres de los proyectos consisten en expedir un acto administrativo firmado por el señor gobernador, en donde se da cuenta del balance financiero, cumplimiento de metas e indicadores y demás aspectos relevantes en la ejecución de los proyectos. Desde el año 2020 se viene desarrollando una estrategia de acompañamiento permanente por parte de la Dirección de Gestión de la Inversión en el cierre de proyectos lo que ha permitido a la fecha cerrar **14** proyectos así:

BPIN	Nombre del proyecto	Entidad
2013000100217	Fortalecimiento de la competitividad del sector floricultor colombiano mediante el uso de ciencia, tecnología e innovación aplicadas en el departamento de cundinamarca	Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación
2017000050061	Adquisición ambulancias de transporte asistencial básico (tab) y transporte asistencial medicalizada (tam), para el apoyo del sistema de referencia y contra referencia de la red hospitalaria del departamento de cundinamarca	Secretaría de Salud
2013000050051	Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos, a través de sistemas regionales en las provincias de ubate y rionegro en el departamento de cundinamarca	Secretaría de Ambiente
2017000050062	Fortalecimiento de las cadenas productivas de mango, aguacate y cítricos en el departamento de cundinamarca	Secretaría de Agricultura
2019000050036	Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento de la red hospitalaria del departamento cundinamarca	Secretaría de Salud

BPIN	Nombre del proyecto	Entidad
2013000100247	Investigación e innovación tecnológica y apropiación social de conocimiento científico de orquídeas nativas de cundinamarca	Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
2012000050029	implementación y masificación del servicio de gas combustible por redes para municipios de Anolaima, Cachipay, Choachi, Fomeque, Ubaque y Viota cundinamarca	Secretaria de Minas y Energía y gas
2016000050005	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente - 2016	Secretaria de Educación
2017000050033	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para municipios no certificados del departamento de cundinamarca	Secretaria de Educación
2019000050044	Fortalecimiento a la estrategia de alimentación Escolar para Municipios no certificados, Vigencia 2019 del Departamento de Cundinamarca	Secretaria de Educación
2013000050027	Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la productividad y la competitividad en el departamento de cundinamarca, centro oriente	Secretaria de Agricultura
2013000050028	Fortalecimiento del subsector panelero en el departamento de cundinamarca	Secretaria de Agricultura
2017000050064	Construcción de redes eléctricas en zona rural de 13 municipios, en el marco del proyecto iluminando vidas del departamento de cundinamarca	Secretaria de Minas y Energía
2020000050012	Adquisición de elementos de protección de contagio del virus covid-19 para los cuerpos operativos de emergencia, en atención de la calamidad sanitaria en el departamento de cundinamarca	Unidad de Gestión del Riesgo

PROYECTOS SIN CERRAR

De conformidad con el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.4.2.6.1 el cual establece que corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con **recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes** a la finalización de estos, expedir el acto administrativo correspondiente.

A la fecha se encuentran **9** proyectos sin cerrar, lo que está ocasionando alertas en la plataforma Gesproy y por ende una mala calificación en el Índice de Gestión de Proyectos.


BPIN	Nombre del Proyecto	Entidad
2012000100056	Investigación estrategias de valoración y apropiación de los recursos naturales mecanismos de adaptación al cambio climático región del bajo magdalena	Ciencia Tecnología e Innovación
2012000050025	Construcción de un centro de atención especializada al servicio de adolescentes infractores de la ley penal en el departamento de Cundinamarca	Secretaria de Gobierno

BPIN	Nombre del Proyecto	Entidad
2012000050030	Desarrollo creación y fortalecimiento de nueve (9) centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el departamento de Cundinamarca	Secretaria de Competitividad
2018000050019	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente 2018 Cundinamarca	Secretaria de Educación
2012000050010	Estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural palacio de san francisco en Bogotá D.C. departamento de Cundinamarca	Secretaria General
2013000050026	Construcción redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutiérrez en el departamento de cundinamarca	Secretaria de Minas y Energía
2012000050023	Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo regional en el departamento de cundinamarca	Secretaria de Agricultura
2017000050027	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de Cundinamarca, centro oriente 2017 cundinamarca	Secretaria de Educación
2019000050020	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes para el año 2019 en los municipios del departamento de Cundinamarca	Secretaria de Educación

ESTADO DE ALERTAS PLATAFORMA GESPROY

A continuación, se presentan las alertas identificadas en la plataforma Gesproy, con corte 20 de agosto de 2021 en donde se relaciona por cada secretaria a fin de que se tomen las acciones pertinentes y lograr la subsanación de estas.

TOTAL ALERTAS: **54**

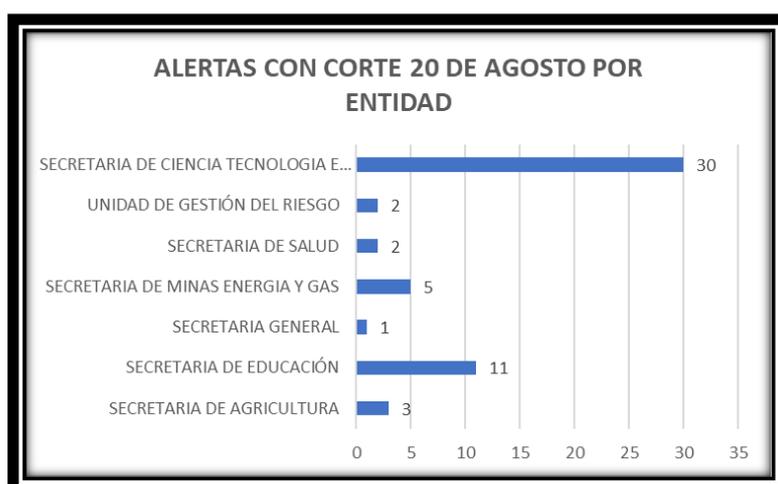

SECRETARIA DE AGRICULTURA

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 267	2012000050023	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CAFETERA COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE DE DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
II-Información inconsistente	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 25 Ejecución promedio productos: 0	2017000050065	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ICO-Información incompleta	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 236	2017000050065	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 663	2019000050020	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes para el año 2019 en los municipios del Departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 1332	2017000050027	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca , centro oriente 2017 Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 602	2018000050019	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente 2018 Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro días:	2020000050037	Dotación del mobiliario escolar para las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 4298761580 Valor contrato fuentes 0 Diferencia	2020000050019	Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar para el año 2020, en los municipios del Departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : 109952, 109953, 109954, 109960 y 109964	2020000050037	Dotación del mobiliario escolar para las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 196229287 Valor contrato fuentes 171026574 Diferencia	2017000050027	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de Cundinamarca , centro oriente 2017 Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro días:	2020000050037	Dotación del mobiliario escolar para las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
II-Información inconsistente	Proyecto con monto de contratación mayor al valor aprobado	Valor contratado supera en \$12,505,783,161.19, el valor aprobado del proyecto.	2017000050027	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente 2017 cundinamarca
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 14363959272 Valor contrato fuentes 14177061494 Diferencia	2017000050027	Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del departamento de cundinamarca, centro oriente 2017 cundinamarca
II-Información inconsistente	Proyecto con monto de contratación mayor al valor aprobado	Valor contratado supera en \$4,186,120,562.00, el valor aprobado del proyecto.	2020000050019	Fortalecimiento a la Estrategia de Alimentación Escolar para el año 2020, en los municipios del Departamento de Cundinamarca

SECRETARIA GENERAL

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 967	2012000050010	Estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural palacio de san francisco en Bogotá D.C. departamento de cundinamarca

SECRETARIA DE MINAS ENERGIA Y GAS

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
II-Información inconsistente	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 29,03 Ejecución promedio productos: 70,08	2013000050026	Construcción redes electricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutiérrez en el departamento de cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 2063	2013000050026	construcción redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutiérrez en el departamento de cundinamarca
II-Información inconsistente	Proyecto con monto de contratación mayor al valor aprobado	Valor contratado supera en \$2,996,192,120.00, el valor aprobado del proyecto.	2019000050073	Ampliación de la Cobertura Del Servicio de Gas Combustible Domiciliario a Tráves de la financiación de la Conexión y la red Interna Para Usuarios de Barrios Periféricos, Veredas y Centros Poblados del Departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 502468110 Valor contrato fuentes 263092050 Diferencia	2019000050073	Ampliación de la Cobertura Del Servicio de Gas Combustible Domiciliario a Tráves de la financiación de la Conexión y la red Interna Para Usuarios de Barrios Periféricos, Veredas y Centros Poblados del Departamento de Cundinamarca

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 1449456060 Valor contrato fuentes 1210080000 Diferencia	2019000050073	Ampliación de la Cobertura Del Servicio de Gas Combustible Domiciliario a Tráves de la financiación de la Conexión y la red Interna Para Usuarios de Barrios Periféricos, Veredas y Centros Poblados del Departamento de Cundinamarca

SECRETARIA DE SALUD

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 6742848 Valor contrato fuentes 30342816 Diferencia	2020000050003	Adquisición de ambulancias, equipos biomédicos, elementos de protección personal, aseo y desinfección para la atención de la calamidad sanitaria por Covid-19 en las E.S.E del departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 6742848 Valor contrato fuentes 30342816 Diferencia	2020000050003	Adquisición de ambulancias, equipos biomédicos, elementos de protección personal, aseo y desinfección para la atención de la calamidad sanitaria por Covid-19 en las E.S.E del departamento de Cundinamarca

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 617 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 04/06/2020	20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : UAEGRD-CMA-056-2021	20172401060022	Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte

SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 248 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100696	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la reactivación económica y la transformación productiva en Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos sin registro de inicio del proceso de selección o de ordenación del gasto	Han transcurrido 248 desde la aprobación, la fecha límite para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 19/06/2021	2020000100650	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la innovación educativa en los niveles de básica y media mediante uso de las tics en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de cundinamarca
II-Información inconsistente	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.dias :	2013000100129	Incremento en las estrategias sustentables en el uso del recurso de energía eléctrica para la población vulnerable en el dpto. de cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : S/N	2018000100160	Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías de investigación para docentes del departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2019000050026	Desarrollo de un programa productivo amigable con el medio ambiente del sector ganadero en el Departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100696	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la reactivación económica y la transformación productiva en Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor agregado en el Departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100695	desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades comunitarias en la comprensión y mitigación de los problemas de violencias basadas en género derivadas de la emergencia por covid 19 en cundinamarca
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 403410000 Valor contrato fuentes 105655000 Diferencia	2013000100129	Incremento en las estrategias sustentables en el uso del recurso de energía eléctrica para la población vulnerable en el dpto. de cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la ciencia y la tecnología - un viaje con la ciencia en el departamento de cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2018000100160	formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías de investigación para docentes del departamento de cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100650	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la innovación educativa en los niveles de básica y media mediante uso de las tics en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de cundinamarca

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 4756402724 Valor contrato fuentes 3693673299 Diferencia	2013000100129	Incremento en las estrategias sustentables en el uso del recurso de energía eléctrica para la población vulnerable en el dpto. de cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro días:	2020000100649	Fortalecimiento de capacidades de ctei para el relacionamiento escuela - contexto rural mediante la apropiación y uso de las TICs en el municipio de sibaté departamento de cundinamarca
ICO-Información incompleta	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo Valor contrato 32000000 Valor contrato fuentes 44000000 Diferencia	2013000100248	Innovación , ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de ubate, cundinamarca.
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : No aplica	2020000100695	Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades comunitarias en la comprensión y mitigación de los problemas de violencias basadas en género derivadas de la emergencia por Covid 19 en Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : No aplica	2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor agregado en el Departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro días:	2018000100160	Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías de investigación para docentes del departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : No aplica	2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la Ciencia y la tecnología - Un viaje con la ciencia en el departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro días:	2020000100695	Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que fortalezcan capacidades comunitarias en la comprensión y mitigación de los problemas de violencias basadas en género derivadas de la emergencia por Covid 19 en Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : No aplica	2020000100649	Fortalecimiento de capacidades de CTeI para el relacionamiento escuela - contexto rural mediante la apropiación y uso de las TICs en el municipio de Sibaté departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro días:	2012000100144	Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial con el fin de mejorar todo el departamento, cundinamarca, centro oriente
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro días:	2020000100696	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la reactivación económica y la transformación productiva en cundinamarca

TIPO_ALERTA	DESCRIPCION DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100650	Fortalecimiento de capacidades de ctei para la innovación educativa en los niveles de básica y media mediante uso de las tics en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : No aplica	2019000050026	Desarrollo de un programa productivo amigable con el medio ambiente del sector ganadero en el Departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100246	Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua por medio del desarrollo e implementación de dos (2) paquetes tecnológicos para la generación de productos con valor agregado en el Departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100266	Generación de espacios de encuentro de la sociedad con la Ciencia y la tecnología - Un viaje con la ciencia en el departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2020000100649	Fortalecimiento de capacidades de CTel para el relacionamiento escuela - contexto rural mediante la apropiación y uso de las TICs en el municipio de Sibaté departamento de Cundinamarca
ICO-Información incompleta	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.	Proyectos: Proceso(s) sin relacionar cdp : S/N	2018000100160	Formación de capital humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación maestrías de investigación para docentes del departamento de Cundinamarca
NRI-No reporte de información	Proyectos sin programación registrada	Proyectos sin programación registrada Nro dias:	2019000050026	Desarrollo de un programa productivo amigable con el medio ambiente del sector ganadero en el Departamento de Cundinamarca

Se recomienda trabajar en conjunto con la secretaria de hacienda (Plataforma SPGR) en la subsanación de las alertas que presentan las siguientes observaciones.

Proceso(s) sin relacionar CDP	Cargar desde el SPGR el acto de apertura del proceso contractual o ordenación del gasto
Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	Validar cierre presupuestal del Bienio, los pagos, los CDP que hicieron en 2021 y RP

Así mismo se recomienda trabajar articuladamente con la Dirección de Gestión secretaria de planeación (Plataforma GESPROY) en la subsanación de las alertas que presentan las siguientes observaciones.

Proyectos sin programación	Realizar el cargue del proyecto en la metodología 2 recomendada
Proyectos sin cerrar	Elaborar resolución de cierres
